

Anlage 1 zu Vorlage 175/2026


Die Rohbauarbeiten sind gestartet. Die nachfolgenden Aufnahmen stellen den Stand in der 24./25. KW 2026 dar. In ca. vier Wochen werden die Betonfertigteile geliefert. Wenn die Fassade im Frühjahr 2027 geschlossen ist, erfolgt der Innenausbau.



Stützwände am östlichen Grundstücksgrenze. Die Oberkante entspricht dem späteren Geländeniveau der Hoffläche




Baugrube nach Einbau der Grundleitungen und Verfüllung

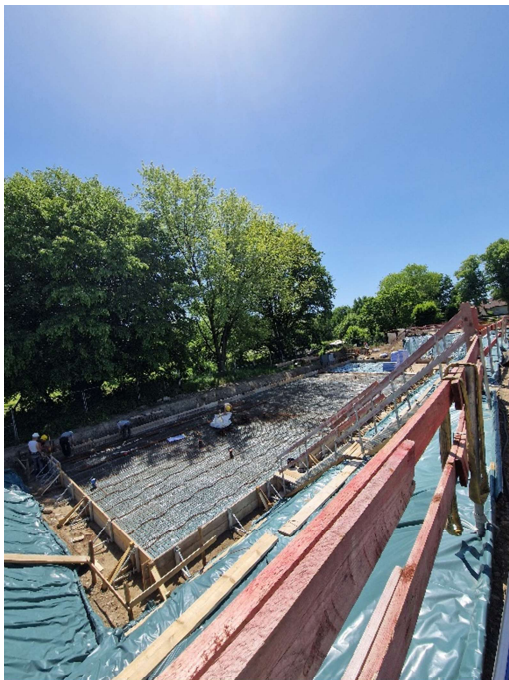

Verlegung untere Bewehrungslage



Untere Bewehrungslage mit Abstandhaltern

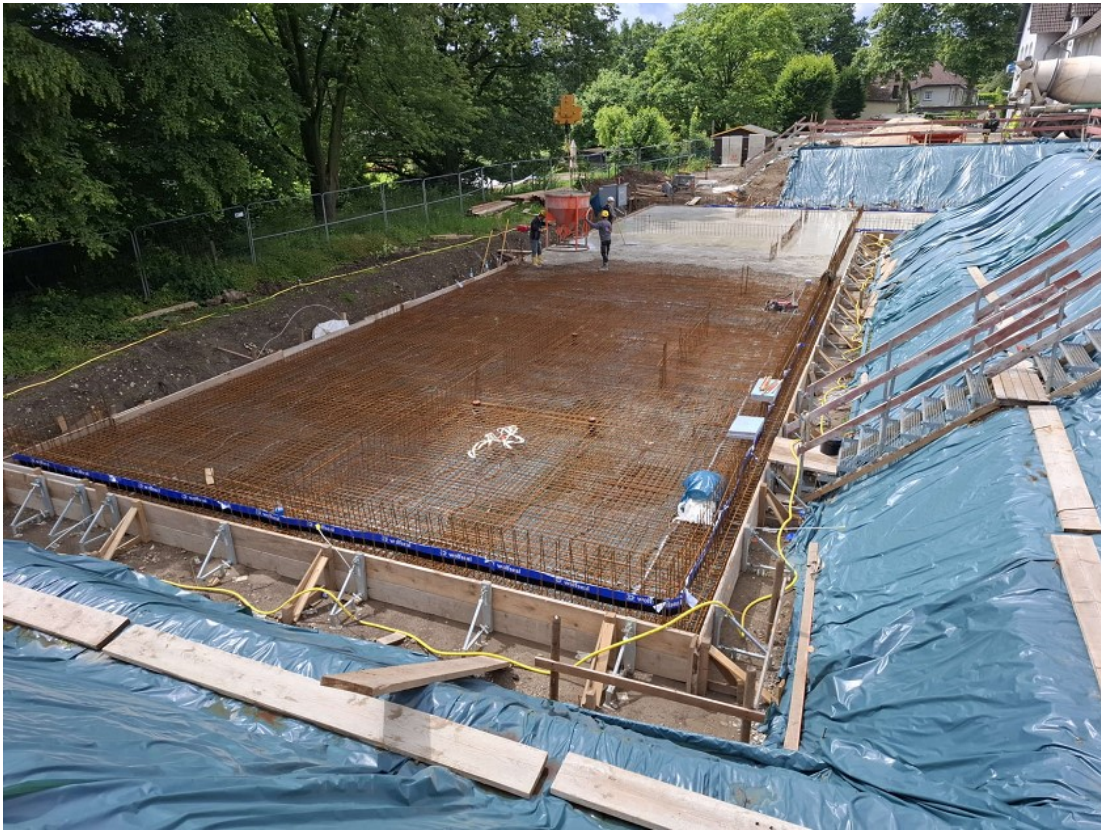

Betonieren der Bodenplatte Untergeschoss



Betonierte Bodenplatte mit Anschlusseisen für die aufgehenden Wände – die späteren Räume sind ablesbar



Dämmung für die erdberührten Außenwände
